

仙台東部道路 下飯田橋補修工事
品質管理試験写真 施工フローチャート (1/2)

① 基準試験(圧力選定)
150MPaを良好と判定



① コンクリート表面処理工 基準試験

② 基準試験(圧力選定)
ディスクサンダー処理を良好と判定



④ コンクリート表面処理工 基準試験

③ 基準試験(付着試験)
付着性能1.5N/mm以上
(150MPa)合格



② コンクリート表面処理工 基準試験

④ 基準試験(付着試験)
付着性能1.5N/mm以上
(ディスクサンダー)合格


⑤ 日常管理試験
圧力確認状況150MPa



⑤ コンクリート表面処理工 日常管理試験

⑥ 日常管理試験
温湿度確認状況
5℃以上・85%未満

⑦ 日常管理試験
繊維シートのラップ長
100mm以上の確認

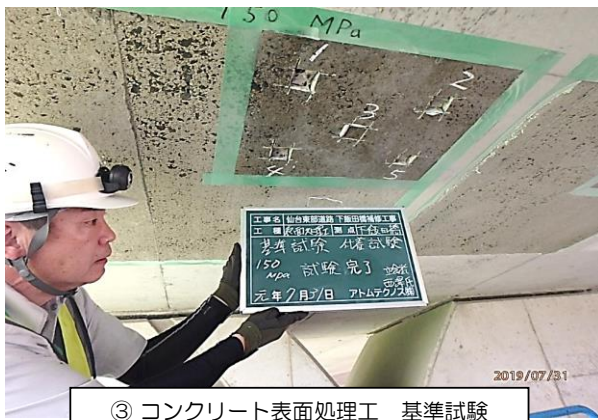

③ コンクリート表面処理工 基準試験

⑧ 日常管理試験
プライマー塗布前表面含水率
社内規格値5%以下の確認



⑥ 各・工種 日常管理試験



⑦ 連続繊維シート接着工 日常管理試験



⑧ 連続繊維シート接着工 日常管理試験
